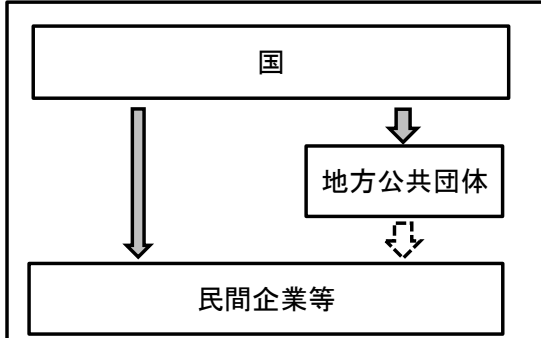


## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	港湾局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	技術企画課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策		
対策における施策の名称	河川・海岸・道路・港湾・空港・鉄道・航路標識・上下水道等の防災対策		
(事業名)	港湾における地震・津波対策	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	59億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	社会資本整備事業特別会計港湾勘定
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	近いうちに発生が懸念される地震・津波等に対し、事前防災・減災効果として、耐震強化岸壁、防波堤等の整備を推進する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに 【直轄】入札公告率:概ね100% 【補助】交付決定率:100% 平成26年3月末までに 【直轄】契約率:概ね100% 【補助】交付決定率:100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 近いうちに発生が懸念される地震・津波等に対し、耐震強化岸壁や防波堤等を整備することにより、平常時の効率的で安全な物流とともに、事前防災・減災対策として被災時の緊急物資の輸送等を確保する(実施箇所:11港)。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(進捗実績) 直轄事業については、平成25年2月下旬より、入札公告開始。一部契約締結済。 補助事業については、各地方公共団体からの申請により、交付決定を行った。</p> <p>(今後のスケジュール) 直轄事業については、平成25年2月下旬より、順次入札手続き等に着手し契約を締結。平成26年3月末までに契約手続き完了。</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p>  <pre> graph TD     A[国] --&gt; B[地方公共団体]     B --&gt; C[民間企業等]   </pre>		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。また、地方公共団体に対しても入札・契約手続きの簡素化等に関して周知したところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>【事業に関する概要】<a href="http://www.mlit.go.jp/common/000988904.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/000988904.pdf</a></p> <p>【事業の予算配分先一覧】<a href="http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html">http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html</a></p> <p>【入札公告・契約内容】<a href="http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/">http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/</a>、<a href="http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm">http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm</a></p>		
