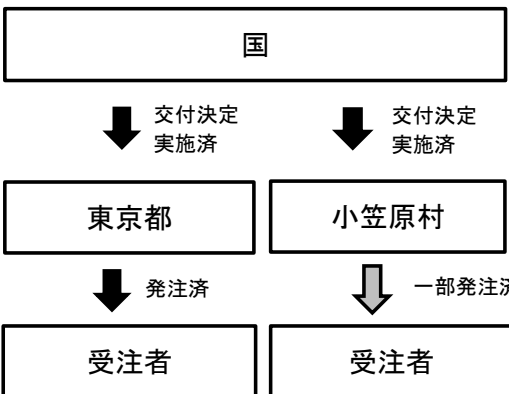


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)			
対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	国土政策局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	特別地域振興官
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策		
対策における施策の名称	その他		
(事業名)	小笠原諸島における津波対策の推進	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	10億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されている東京都小笠原村における防波堤改良及び浄水場の高台移転を行う。 交付対象者 (防波堤改良)東京都 (浄水場高台移転)小笠原村		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年度末までに 【防波堤改良】 平成25年6月末までに契約件数1件(執行率40%)、平成26年3月末までに契約件数1件(執行率100%) 【浄水場の高台移転】 平成25年6月末までに契約件数7件(執行率40%)、平成26年3月末までに契約件数7件(執行率100%)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 津波発生時に、漁港後背地の被害低減、漁港機能の確保及び村民の生活用水の確保を図る。 【防波堤改良】 防波堤の改良率:約94%(平成24年度当初予算 約82%) 【浄水場の高台移転】 事業進捗率:約72%(平成24年度当初予算 約24%)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績・今後のスケジュール) 【防波堤改良】 平成25年2月28日に交付申請。 平成25年3月5日に交付決定。 平成25年5月21日に契約済。 平成25年5月21日より事業開始。  【浄水場の高台移転】 平成25年2月28日に交付申請。 平成25年3月5日に交付決定。 平成25年4月24日に6件契約済。 平成25年4月25日より事業開始。  <b>【進捗ステップのイメージ図】</b>  <pre>graph TD     A[国] -- "交付決定 実施済" --&gt; B[東京都]     A -- "交付決定 実施済" --&gt; C[小笠原村]     B -- "発注済" --&gt; D[受注者]     C -- "一部発注済" --&gt; E[受注者]</pre>		
執行早期化のために 講じている工夫	地方公共団体に対しても入札・契約手続きの簡素化等に関して周知したところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)			
